

川越市蔵造り資料館店蔵耐震化工事 令和7年3月の進捗状況写真

【進捗状況】



大津縛り塗り前の斑直し



大津縛り塗り

川越市蔵造り資料館店蔵耐震化工事 令和7年3～4月の進捗状況写真

【進捗状況】



大津縛り塗り・屋根土居塗漆喰仕上げ完了

川越市蔵造り資料館店蔵耐震化工事 令和7年4月の進捗状況写真

【進捗状況】



砂漆喰・大津縛りに続く腰巻中塗り



大津縛り後の斑直し(外壁)

川越市蔵造り資料館店蔵耐震化工事 令和7年5月の進捗状況写真

【進捗状況】



外壁に水切りを施す



屋根土居塗漆喰仕上げの上に瓦棧設置・箱棟木下地完了(最上部)



瓦棧に置かれたいぶし瓦 瓦葺き準備



屋根瓦葺き

川越市蔵造り資料館店蔵耐震化工事 令和7年6月の進捗状況写真

【進捗状況】



2階和室鼠漆喰壁木摺り下地



外壁中塗り



耐震補強壁基礎打設



鬼瓦(鬼台下地)設置・箱棟屋根瓦(雁振・熨斗瓦・萱唐草)葺き

川越市蔵造り資料館店蔵耐震化工事 令和7年7月の進捗状況写真

【進捗状況】



鬼瓦と鬼台下地



耐震補強壁木造軸組みフレーム建込み

川越市蔵造り資料館店蔵耐震化工事 令和7年8月の進捗状況写真

【進捗状況】



木柄戸吊り込み後の小舞下地



観音開き戸下塗り

川越市蔵造り資料館店蔵耐震化工事 令和7年9月の進捗状況写真

【進捗状況】



箱棟木下地の腹板に取り付けられた巻小舞



2階和室鼠漆喰壁中塗り

川越市蔵造り資料館店蔵耐震化工事 令和7年10月の進捗状況写真

【進捗状況】



中塗りが完了した戸前口



中塗りが完了したケラバ

川越市蔵造り資料館店蔵耐震化工事 令和7年11月の進捗状況写真

【進捗状況】



観音開き戸中塗り



箱棟屋根漆喰中塗り 鬼台下塗り 影盛下塗り



耐震補強壁木造フレームに塗られた荒壁



2 階和室鼠漆喰壁完了

川越市蔵造り資料館店蔵耐震化工事 令和7年12月の進捗状況写真

【進捗状況】



風切丸瓦に白漆喰塗りを施す（仕上げ）



耐震補強壁の裏側に塗られた荒壁



影盛の状況 (中塗り)



屋根周りの状況

川越市蔵造り資料館店蔵耐震化工事 令和8年1月の進捗状況写真


【進捗状況】



影盛中塗り完了



影盛上塗り(白漆喰)完了 箱棟大面部の仕上げ(黒漆喰)塗り

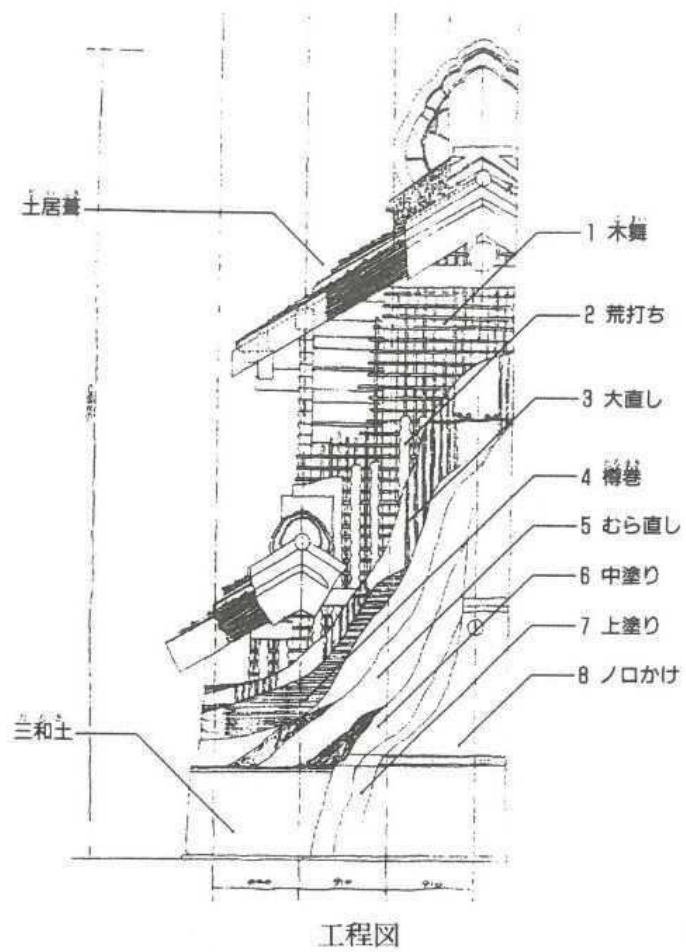

模型の側面 (Model side view)
