

マーガレット保育園放射線詳細測定結果(12月5日実施)

測定結果(単位:μ Sv/h)

[地上50cm] 平均 0.08 範囲 0.06~0.14 → 除染後 平均 0.08 範囲 0.06~0.12


[地上5cm] 平均 0.13 範囲 0.06~0.49 → 除染後 平均 0.11 範囲 0.06~0.29

地上5cmで対応の目安を超えた2地点について除染を行い、目安以下の状態にしました。

単位:μ SV/h

番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	職員及び利用者自転車置き場	0.11	0.09
2	多目的スペース	0.08	0.08
3	多目的スペース	0.14	0.09
4	園庭	0.13	0.09
5	園庭	0.07	0.07
6	園庭	0.08	0.09
7	園庭	0.10	0.07
8	園庭	0.07	0.07
9	園庭	0.09	0.07
10	雨樋	0.49	0.14
10-1	No.10 除染後	0.24	0.12
11	雨樋	0.12	0.08
12	雨樋	0.11	0.06
13	雨樋	0.07	0.06
14	排水口	0.07	0.07
15	雨樋	0.10	0.07
16	排水口	0.07	0.06
17	雨樋	0.07	0.08
18	雨樋	0.29	0.11
19	園庭	0.18	0.10
20	園庭	0.09	0.07
21	駐車場	0.14	0.09
22	駐車場	0.10	0.08
23	駐車場	0.06	0.08
24	雨樋	0.09	0.06
25	雨樋	0.09	0.07
26	雨樋	0.38	0.11
26-1	No.26 除染後	0.18	0.11
27	テラス 排水口	0.06	0.06

注)本市の暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30μ Sv/h、地上50cmで0.25μ Sv/h

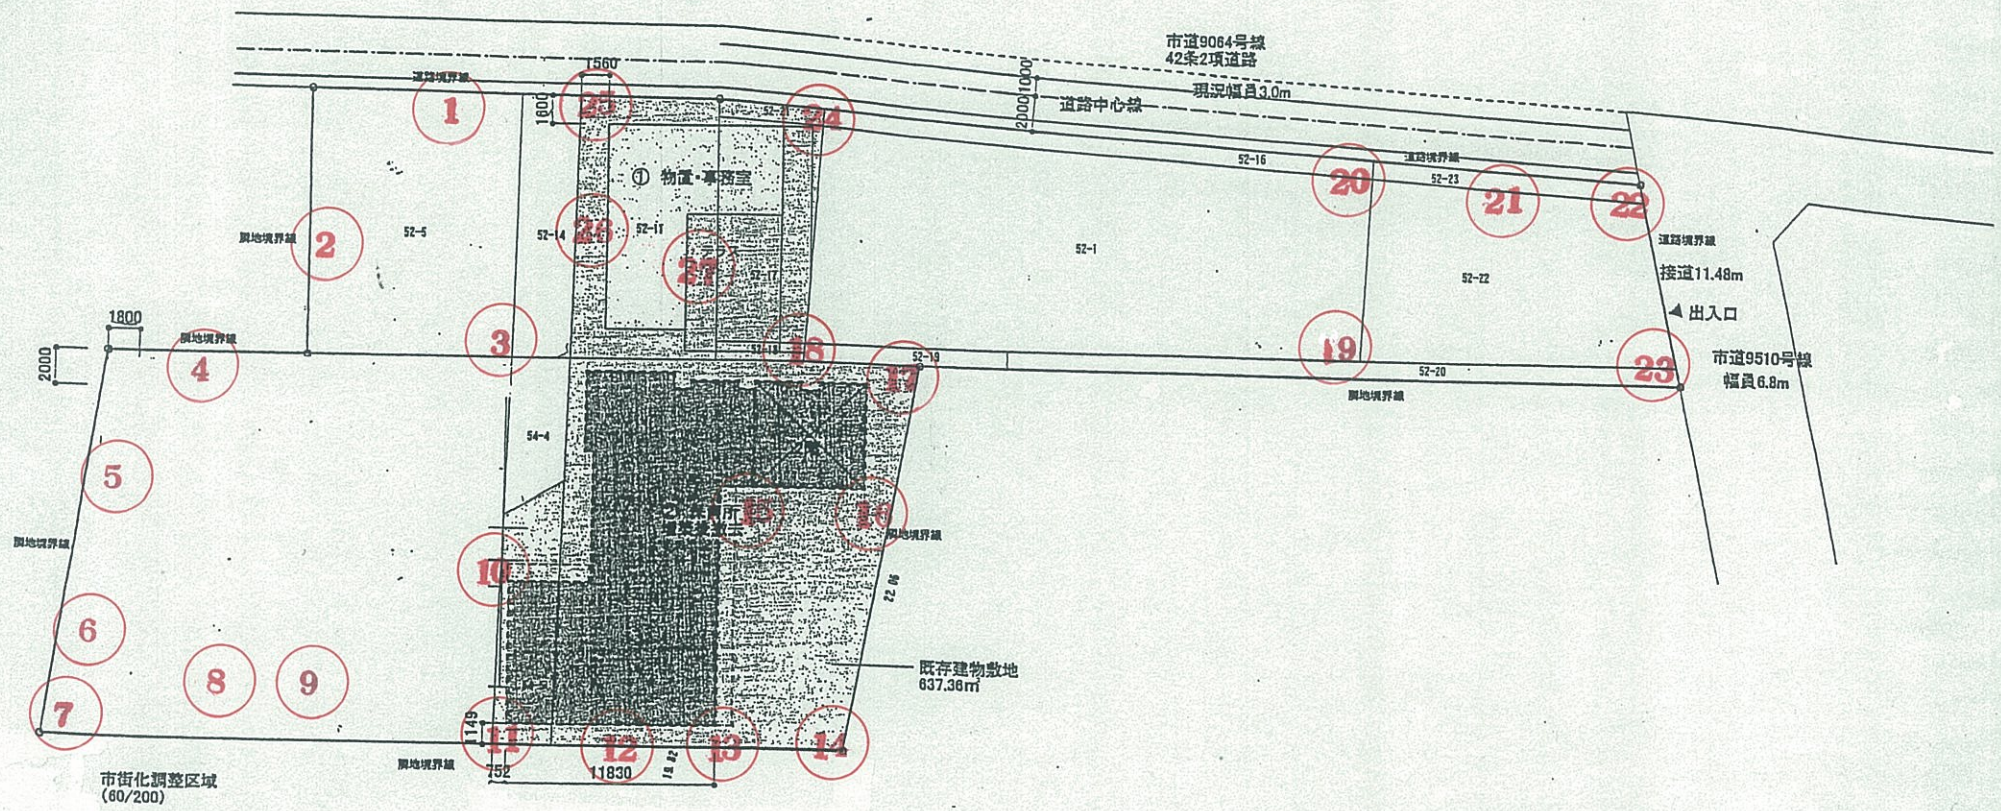

	設計	承認	工事名	マーガレット保育園増築工事	図番
			図名	配置図	
				日付	
